“ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL PLAN PILOTO CARRIL BUS”
-CIUDADES DE TRUJILLO Y PIURA-

Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible

- PROMOVILIDAD -

Enero 2025



1

ACTIVIDADES - TRUJILLO

Área de trabajo

Tramo 02 (*):

- S-N: Av. Pedro Muñiz (Jr. Bolognesi) – Jr. Alfonso Ugarte.
- Longitud de 891m.

- N-S: Av. Jesús de Nazareno – Av. 28 de Julio.
- Longitud de 395m.

Es piloto se realizaría sobre la Av. España, en el tramo que coincide con el futuro corredor del SIT.

(*) Estudio "Desarrollo de medidas de rápido impacto - carriles reservados y paraderos de transporte público en corredor troncal de la ciudad de Trujillo" – GIZ.




Trabajos realizados

- Se llevaron a cabo 8 reuniones técnicas con la MPT.
- Revisión del estudio “Desarrollo de medidas de rápido impacto - carriles reservados y paraderos de transporte público en corredor troncal de la ciudad de Trujillo” – GIZ. (CARRIL BUS).
- Revisión del “Informe de Diagnóstico de Paraderos” elaborado por la MPT.
- Revisión de la lista de zonas rígidas (Av. España).
- Revisión de las rutas de transporte público y colectivos.
- Revisión de la sección vial, sentido de circulación y número de carriles por sentido.
- PROMOVILIDAD capacitó a la MPT para la recopilación de la siguiente información: uso de suelo, estacionamiento en la vía pública, cocheras en los predios, ubicación de paraderos, señalización horizontal y vertical, tipos de intersecciones, intersecciones semafóricas, estado de la infraestructura vial, fotos, entre otros.
- El 12 y 13 de septiembre de 2024 PROMOVILIDAD realizó la comisión a la ciudad de Trujillo, donde se capacitó al personal de la MPT y se realizó el levantamiento de información base en tres turnos: 07:00 – 10:00 AM, 12:00 – 03:00 PM y 05:00 – 08:00 PM, realizándose 4 tipos de encuestas: Ocupación visual, aforos vehiculares, embarque y desembarque de pasajeros y mediciones en GPS.
- PROMOVILIDAD realizó procesamiento y digitalización de la información de campo.
- Se coordino con al MPT la operatividad del Piloto Carril Bus.
- Se elaboraron los planos y metrados de los escenarios de



DATOS DE LA VIALIDAD

AV. ESPAÑA
TRAMO: AV. P. MUÑIZ – AV. A. UGARTE
LONGITUD: 891 METROS
2 SENTIDOS DE CIRCULACIÓN
3 CARRILES POR SENTIDO DE CIRCULACIÓN

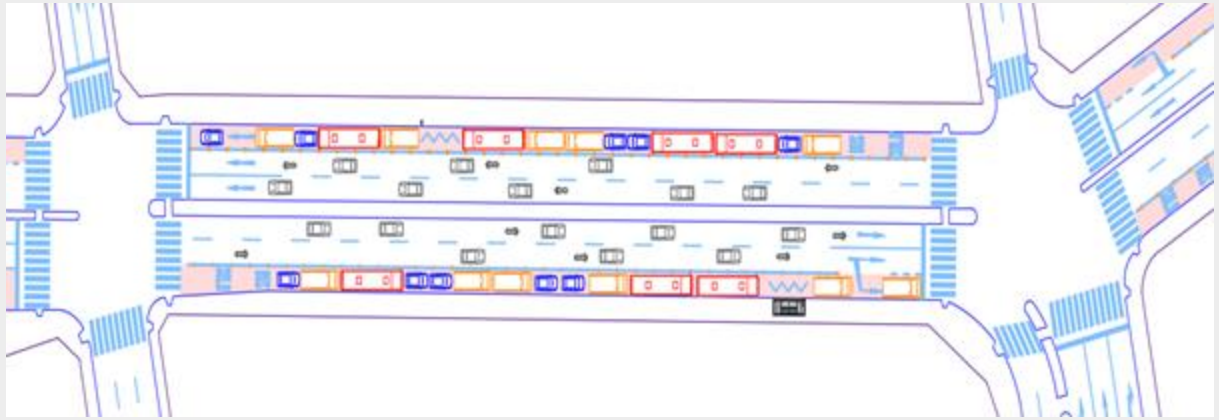

DATOS DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO (HP AM – AMBOS SENTIDOS)

MICRO	140 veh.	1,857 veh.	63.27%
C.R.	231 veh.		
TAXIS	807 veh.		
COLECTIVO	679 veh.		
AUTO	1,078 veh.		38.67%
MOTO LINEAL	168 veh.		





OPERACIÓN DEL PILOTO (PROPUESTA DE LA MPT) : CARRIL BUS PARA TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO

PUEDEN USARLO

MICRO


CAMIONETA RURAL

NO PUEDEN USARLO

COLECTIVOS AUTORIZADOS

AUTOS PRIVADOS

MOTOS LINEALES

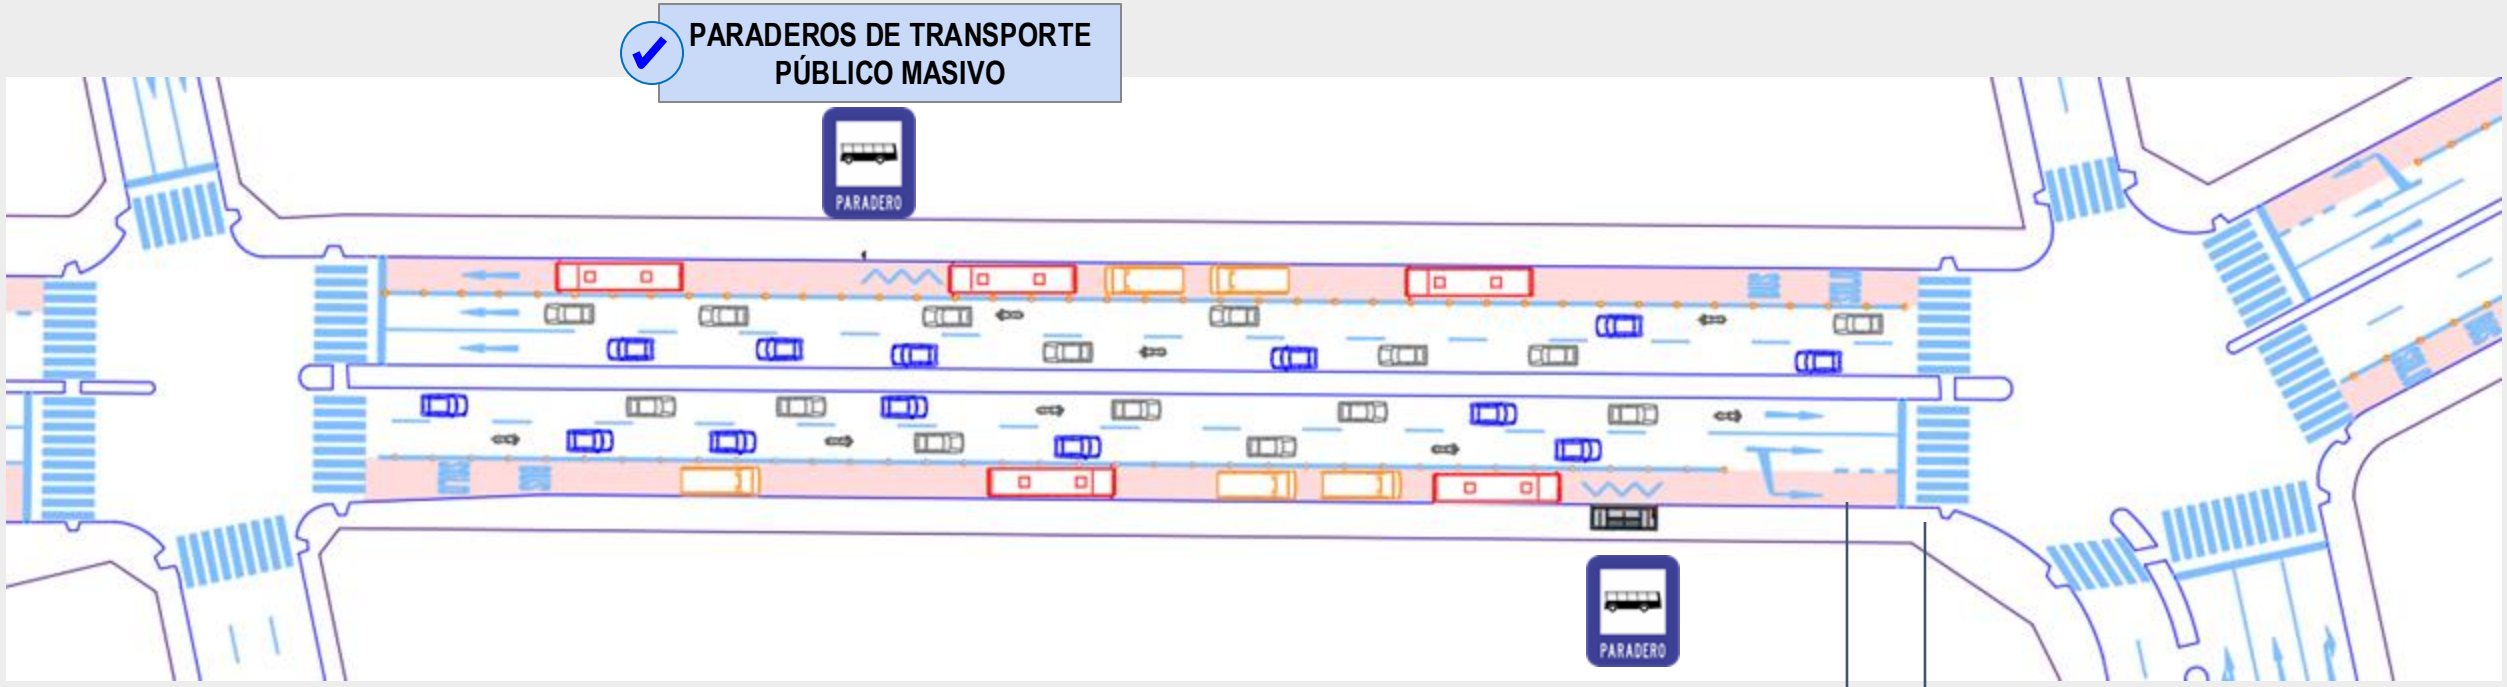

ANTES





DESPUÉS






DESPUÉS






DESPUÉS




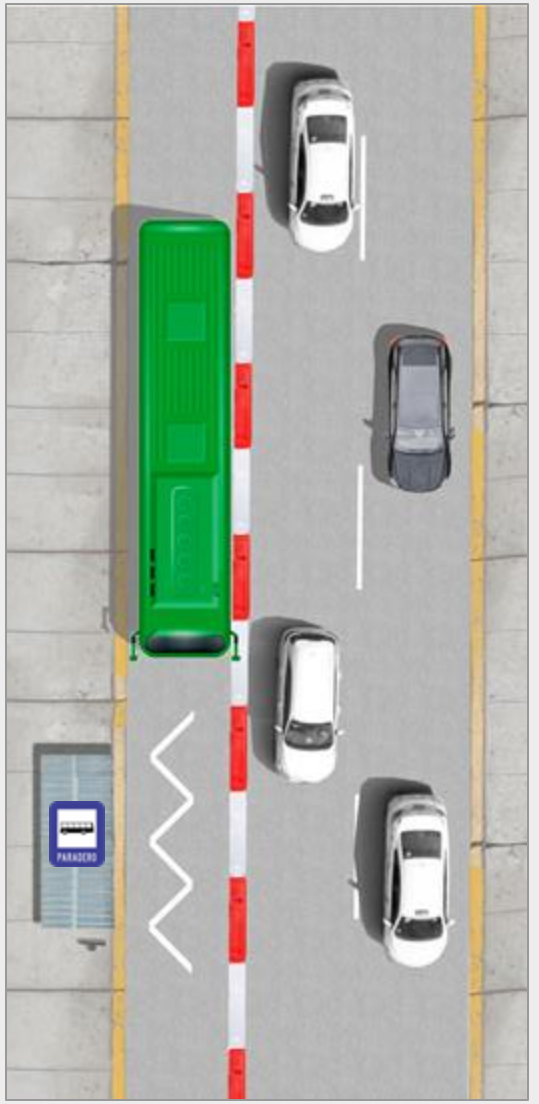


Diseño del Carril Bus

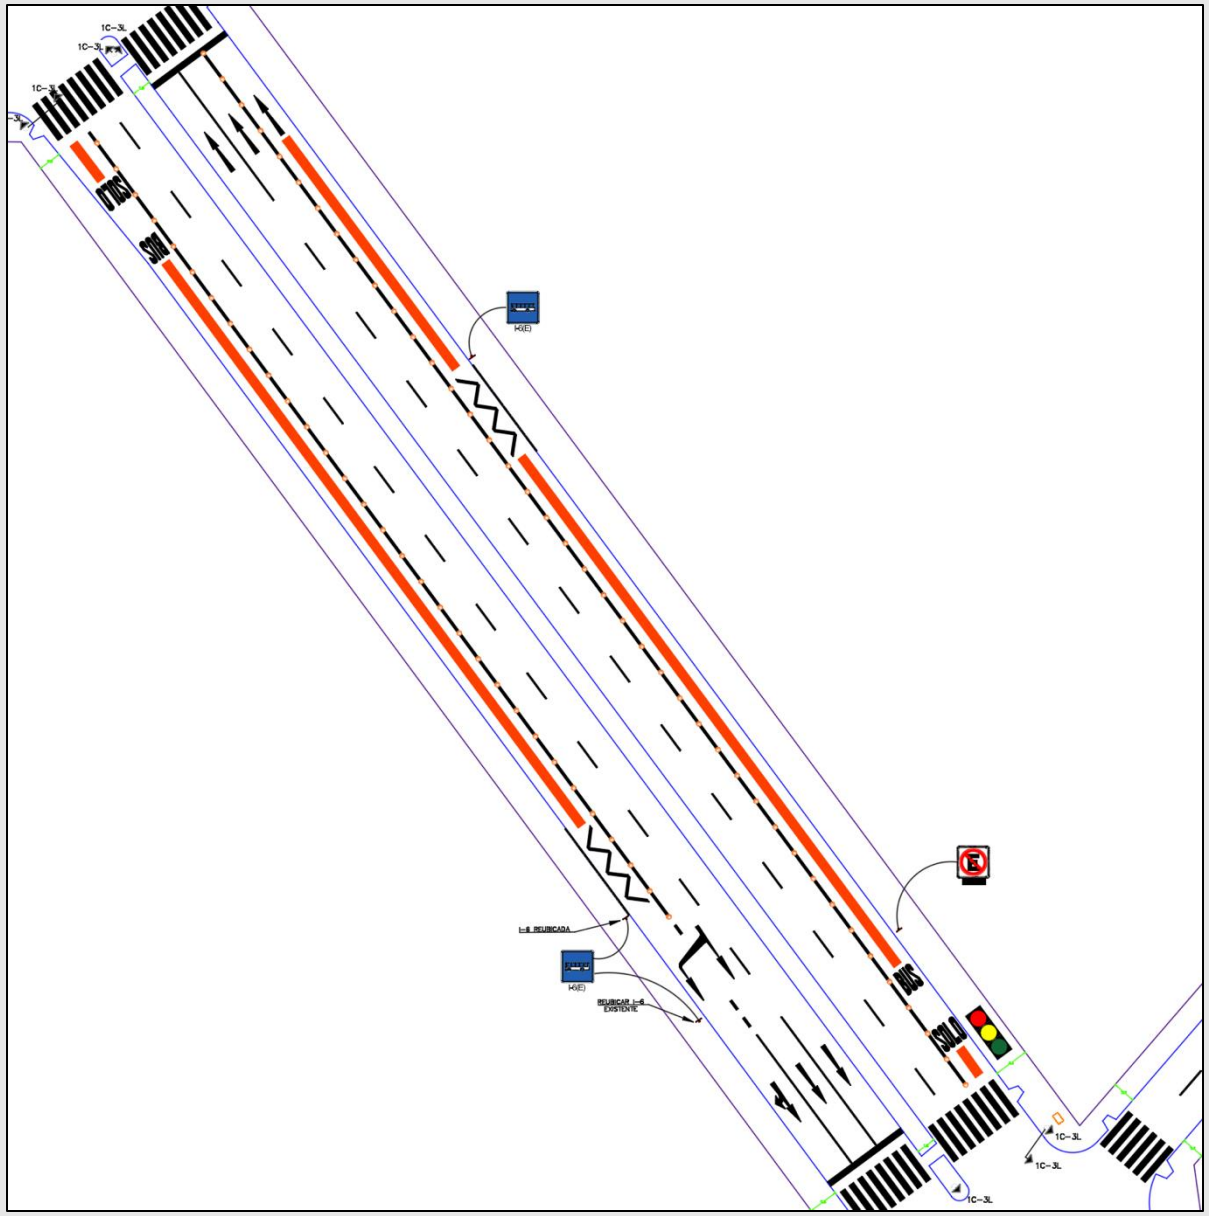
1C-3L
1C-3L
1C-3L


Diseño del Carril Bus

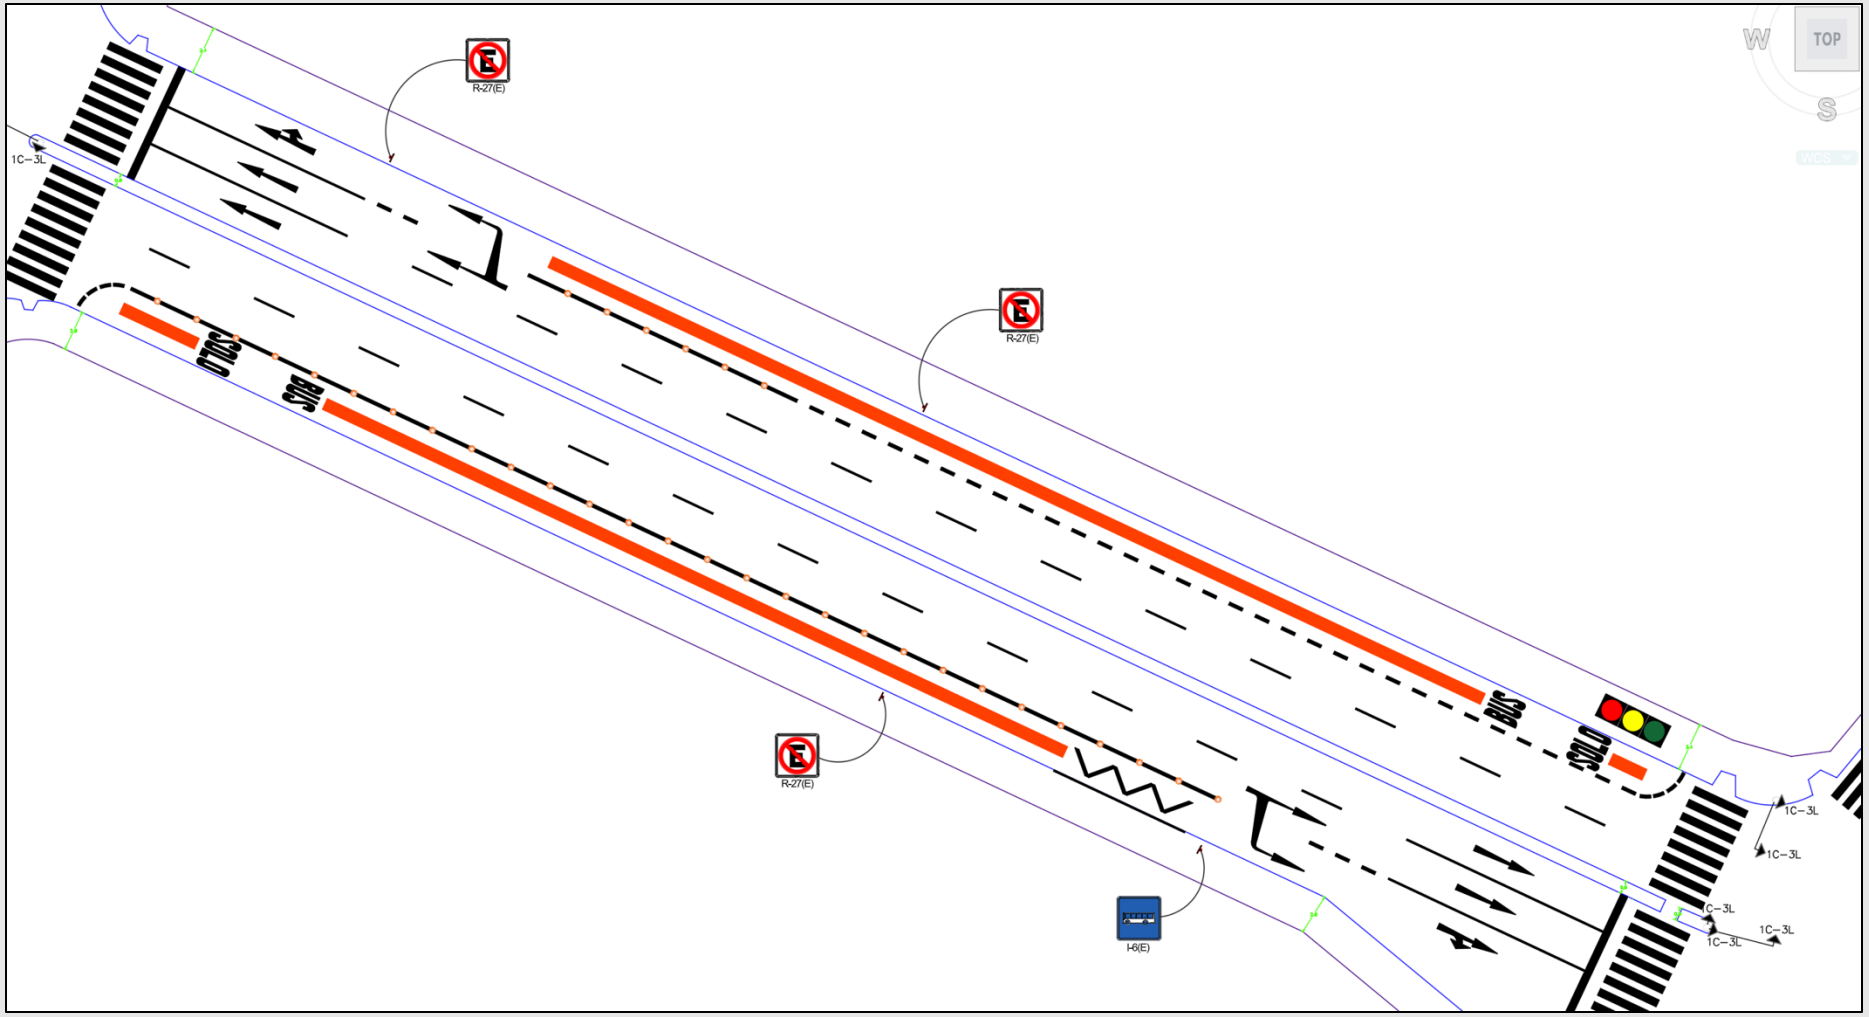

Escenarios

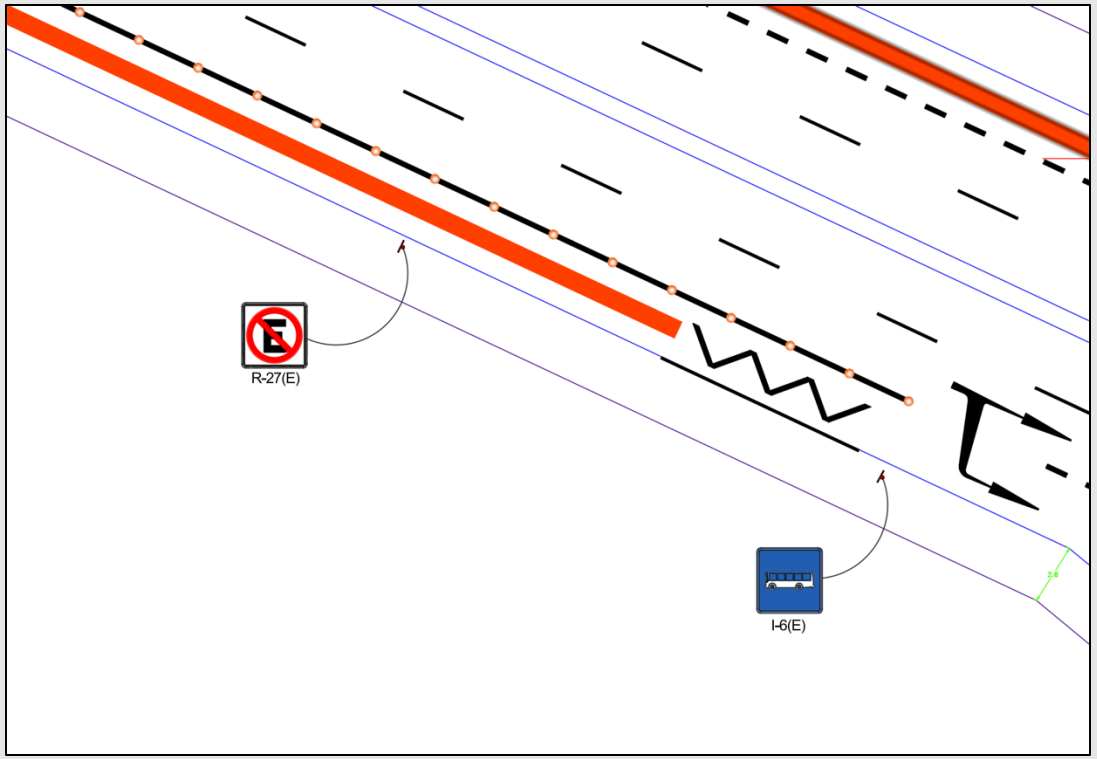

ESCENARIO 01

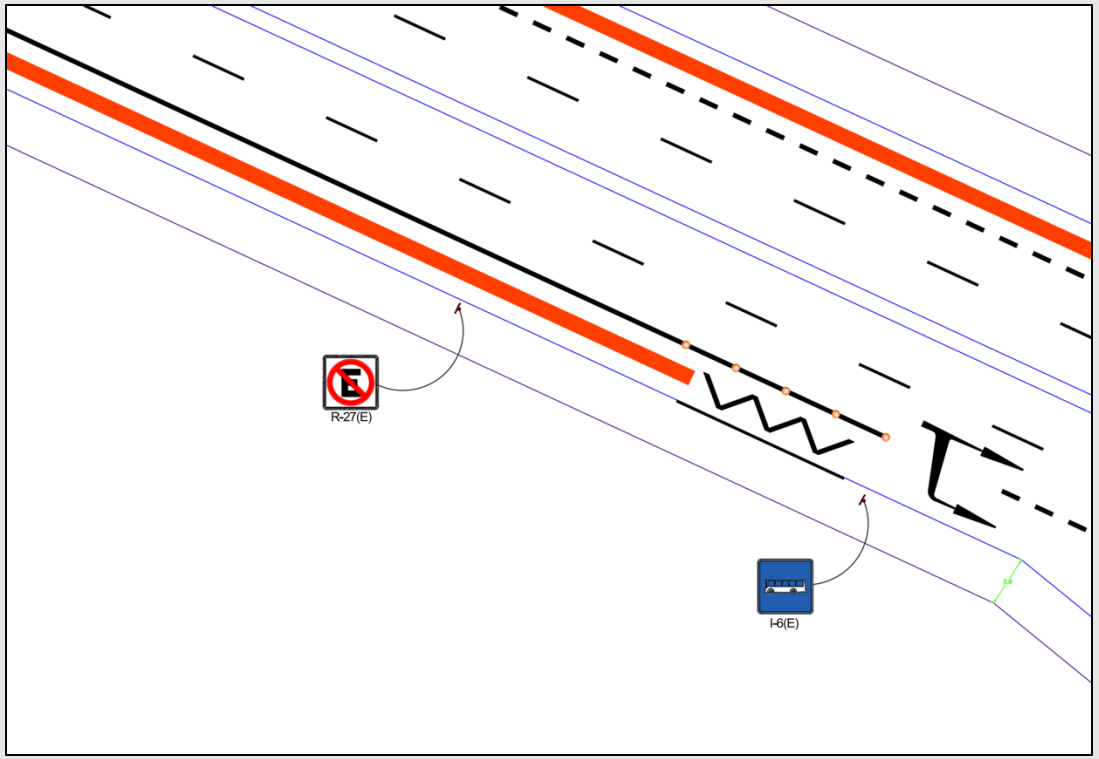

ESCENARIO 02

Presupuesto estimado de los Escenarios

PROPUESTA	SEGREGACIÓN	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN	ADQUISICIÓN
ESCENARIO 01	Conos	S/ 198,975.00	S/ 143,300.00
	Bolardos	S/ 206,175.00	S/ 143,300.00
	New jersey	S/ 282,975.00	S/ 227,300.00
ESCENARIO 02	Conos	S/ 178,775.00	S/ 123,100.00
	Bolardos	S/ 179,915.00	S/ 123,100.00
	New jersey	S/ 192,075.00	S/ 136,400.00



2


ACTIVIDADES - PIURA

Área de trabajo

Tramo de estudio:

- Av. Sullana – Av. Irazola.
- Longitud de 850 m.

Un tramo comprendido en el estudio "Desarrollo de medidas de rápido impacto - carriles reservados y paraderos de transporte público en corredor troncal de la ciudad de Piura" – GIZ.

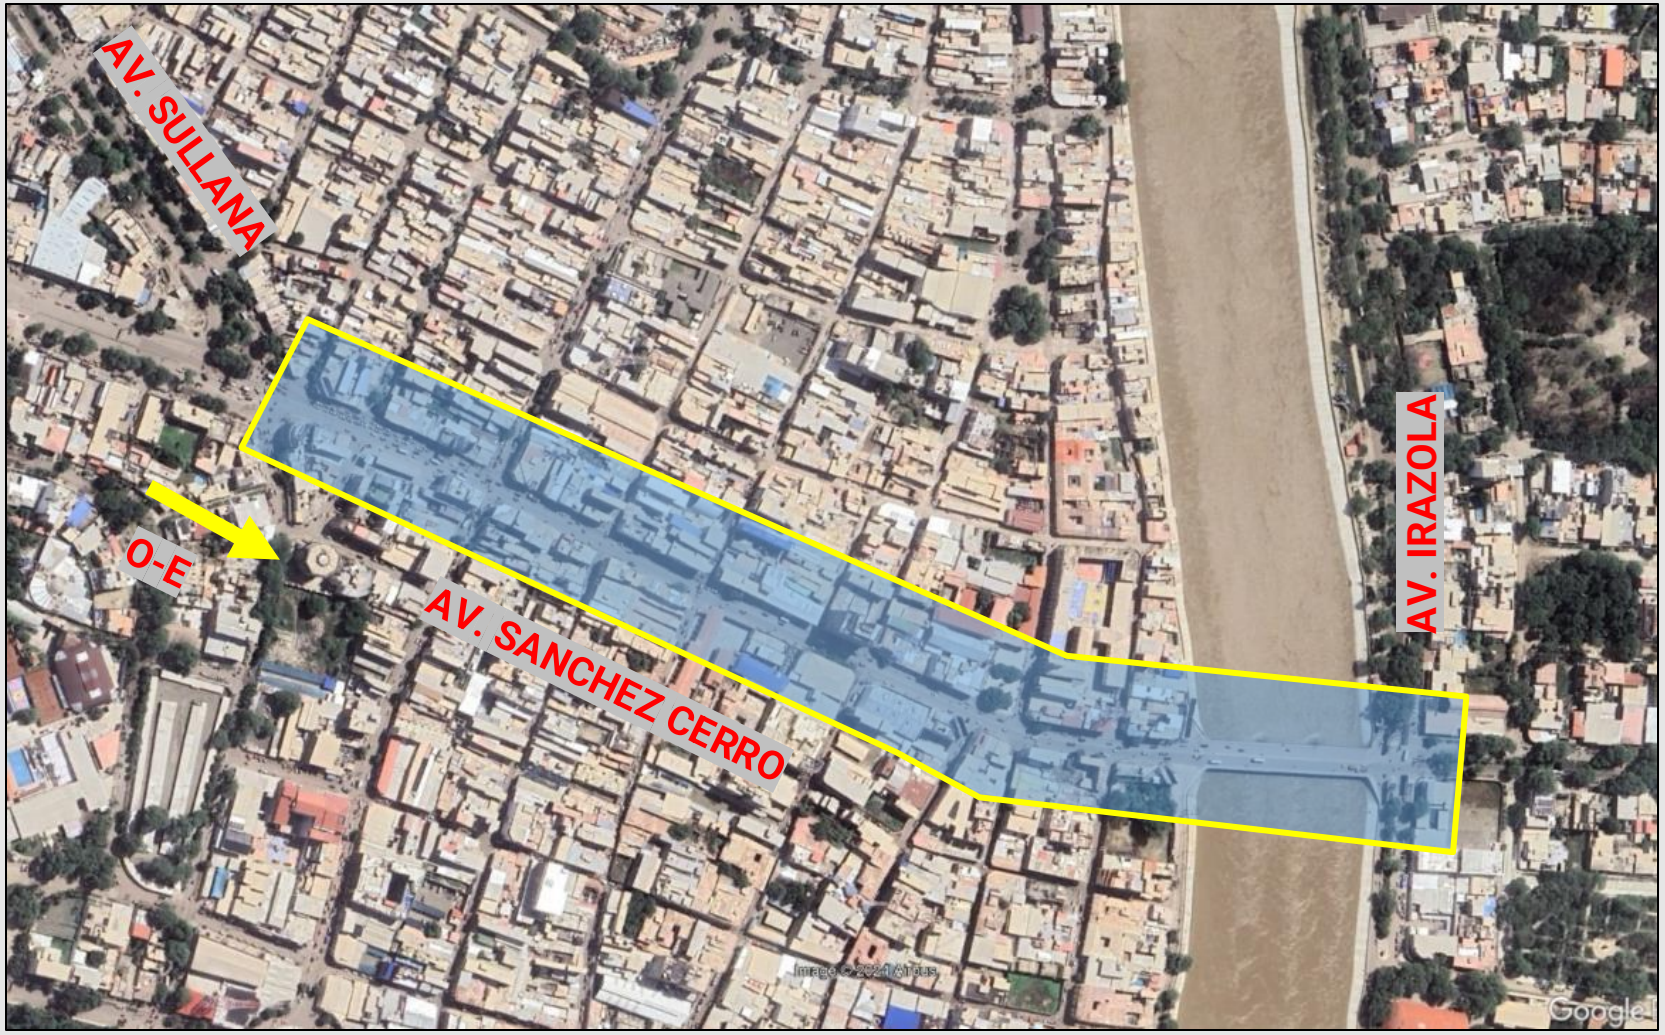

Trabajos realizados

- Se llevaron a cabo 4 reuniones técnicas con la MPP.
- Revisión del estudio “Desarrollo de medidas de rápido impacto - carriles reservados y paraderos de transporte público en corredor troncal de la ciudad de Piura” – GIZ. (CARRIL BUS).
- Revisión de la lista de zonas rígidas (Av. Sanches Cerro).
- Revisión de las rutas de transporte público.
- Revisión de la sección vial, sentido de circulación y número de carriles por sentido.
- PROMOVILIDAD capacitó a la MPP para la recopilación de la siguiente información: uso de suelo, estacionamiento en la vía pública, cocheras en los predios, ubicación de paraderos, señalización horizontal y vertical, tipos de intersecciones, intersecciones semafóricas, estado de la infraestructura vial, fotos, entre otros.
- El 26, 27 y 28 de septiembre de 2024 PROMOVILIDAD realizó la comisión a la ciudad de Piura, donde se capacitó y realizó el levantamiento de información base en tres turnos: 07:00 – 10:00 AM, 12:00 – 03:00 PM y 05:00 – 08:00 PM, realizándose 4 tipos de encuestas: Ocupación visual, aforos vehiculares, embarque y desembarque de pasajeros y mediciones en GPS.
- Procesamiento y digitalización de la información de campo
- **La MPP indico sobre trabajos de recapeo en la vía.**
- **Hubo cambio de Gerente de Transporte y Movilidad Urbana en la MPP.**





3

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PROMOVILIDAD
Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

MUNICIPALIDAD DE PIURA

Ponle PUNCHE y ganamos todos PERÚ

JULIO

REVISIÓN DEL ESTUDIO CARRIL BUS TRUJILLO – GIZ, PARA ANALIZAR LOS TRAMOS POTENCIALES PARA IMPLEMENTAR EL PILOTO.



AGOSTO

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PILOTO A TMT – GTTSV DE LA MPT

CAPACITACIÓN EN RECOLECCIÓN DE DATOS ESTÁTICOS EN EL TRAMO DEL PILOTO.




SETIEMBRE


<u>VIAJE DE COMISIÓN</u>
(CAPACITAR Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE CAMPO DEL GL PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LÍNEA BASE – 04 TIPOS DE ENCUESTA)



OCTUBRE

DIGITALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LÍNEA BASE






NOVIEMBRE

DISEÑO OPERATIVO (ESCENARIOS) Y DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO PARA EL CARRIL BUS (PLANOS)

ELABORACIÓN DEL METRADO Y PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA IMPLEMENTACIÓN




DICIEMBRE

ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE PROYECTO DE INFORME TÉCNICO DE PILOTO CARRIL BUS TRUJILLO



JULIO

REVISIÓN DEL ESTUDIO CARRIL BUS PIURA – GIZ, PARA ANALIZAR LOS TRAMOS POTENCIALES PARA IMPLEMENTAR EL PILOTO.



AGOSTO

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PILOTO A LA MPP

CAPACITACIÓN EN RECOLECCIÓN DE DATOS ESTÁTICOS EN EL TRAMO DEL PILOTO.




SEPTIEMBRE


<u>VIAJE DE COMISIÓN</u>
(CAPACITAR Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE CAMPO DEL GL PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LÍNEA BASE – 04 TIPOS DE ENCUESTA)



OCTUBRE

DIGITALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LÍNEA BASE





NOVIEMBRE

<u>PARALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES</u>
(LA MUNICIPALIDAD INDICO TRABAJOS DE RECAPEO DE LA VIA QUE PUEDAN AFECTAR EL PILOTO, ADEMAS DE CAMBIOS EN LA GERENCIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD URBANA)



DICIEMBRE

ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE PROYECTO DE INFORME TÉCNICO DE PILOTO CARRIL BUS PIURA



Cuadro flujos vehiculares - Linea Base de Trujillo

TURNO	TIPOLOGIA			SENTIDO	VEH/HR/SENTIDO (MODO DE TRANSPORTE)	VEH/HR/SENTIDO (TOTAL AUTORIZADO Y NO AUTORIZADO)	% (TOTAL AUTORIZADO Y NO AUTORIZADO)	TOTAL
MAÑANA	TRANSPORTE NO REGULAR (TAXIS)	AUTORIZADO		NS	544	1,486	50.63%	2,935
				SN	263			
	COLECTIVO	AUTORIZADO		NS	556			
				SN	123			
	TRANSPORTE REGULAR (MICROBUS Y CR)	AUTORIZADO	M	NS	79	371	12.64%	
			CR		106			
			M	SN	61			
			CR		125			
	PARTICULAR	AUTO		NS	805	1,078	36.73%	
				SN	273			
TARDE	TRANSPORTE NO REGULAR (TAXIS)	AUTORIZADO		NS	553	1,668	47.52%	3,510
				SN	364			
	COLECTIVO	AUTORIZADO		NS	653			
				SN	98			
	TRANSPORTE REGULAR (MICROBUS Y CR)	AUTORIZADO	M	NS	57	355	10.11%	
			CR		93			
			M	SN	62			
			CR		143			
	PARTICULAR	AUTO		NS	1,205	1,487	42.36%	
				SN	282			
NOCHE	TRANSPORTE NO REGULAR (TAXIS)	AUTORIZADO		NS	1,078	2,044	51.14%	3,997
				SN	0			
	COLECTIVO	AUTORIZADO		NS	850			
				SN	116			
	TRANSPORTE REGULAR (MICROBUS Y CR)	AUTORIZADO	M	NS	76	158	3.95%	
			CR		82			
			M	SN	-			
			CR		-			
	PARTICULAR	AUTO		NS	1,520	1,795	44.91%	
				SN	275			

Cuadro flujos vehiculares - Linea Base de Piura

TURNO	TIPOLOGIA			VEH/HR/SENTIDO (MODO DE TRANSPORTE)	VEH/HR/SENTIDO (TOTAL AUTORIZADO Y NO AUTORIZADO)	% (TOTAL AUTORIZADO Y NO AUTORIZADO)	TOTAL
MAÑANA	TRANSPORTE NO REGULAR (TAXIS)	AUTORIZADO		54	105	16.36%	642
	TRANSPORTE REGULAR (MICROBUS)	AUTORIZADO	RD-01	51			
			RD-02				
			RD-03				
			RD-04				
			RD-20				
		NO AUTORIZADO	S/R	40	304	47.35%	
			U-01				
			U-11				
			U-12				
	COLECTIVO	NO AUTORIZADO		264			
	PARTICULAR	AUTO		233	233	36.29%	
TARDE	TRANSPORTE NO REGULAR (TAXIS)	AUTORIZADO		55	113	16.92%	668
	TRANSPORTE REGULAR (MICROBUS)	AUTORIZADO	RD-01	58			
			RD-02				
			RD-03				
			RD-04				
			RD-20				
		NO AUTORIZADO	S/R	29	314	47.01%	
			U-01				
			U-11				
			U-12				
	COLECTIVO	NO AUTORIZADO		285			
	PARTICULAR	AUTO		241	241	36.08%	
NOCHE	TRANSPORTE NO REGULAR (TAXIS)	AUTORIZADO		63	123	15.91%	773
	TRANSPORTE REGULAR (MICROBUS)	AUTORIZADO	RD-01	60			
			RD-02				
			RD-03				
			RD-04				
			RD-20				
		NO AUTORIZADO	S/R	32	351	45.41%	
			U-01				
			U-11				
			U-12				
	COLECTIVO	NO AUTORIZADO		319			
	PARTICULAR	AUTO		299	299	38.68%	



4

CONCLUSIONES

Conclusiones

- Debido al elevado flujo de colectivos autorizados que circulan por la Av. España, en la ciudad de Trujillo, resulta necesario definir estrategias para los mismos, a fin de que el piloto carril bus operativamente sea más seguro. Temporalmente se podría evaluar la posibilidad de implementarlo en otra vía de la ciudad.

- Debido a la cantidad de **colectivos informales (aproximadamente el 50% del tránsito en hora punta mañana, tarde y noche)** que compiten con el servicio de transporte público sobre la Av. Sánchez Cerro, en la ciudad de Piura, que generan demoras en el tramo de estudio, es fundamental ejecutar estrategias de fiscalización que permitan eliminar la informalidad y con esto la congestión vehicular que genera la misma, lo cual permitirá implementar un piloto carril bus más seguro. Temporalmente se podría evaluar la posibilidad de implementarlo en otra vía de la ciudad.

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PROMOVILIDAD
Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

MUNICIPALIDAD DE PIURA

Ponle PUNCHE y ganamos todos PERÚ

GRACIAS
