PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CARRIL BUS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO (PILOTO)

Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible

- PROMOVILIDAD -

Agosto 2025



1

ACTIVIDADES REALIZADAS 2025

1.1. Cronograma de trabajo

ENERO


PRESENTACIÓN AL GOBIERNO LOCAL DE LA AT PROPUESTA DE CARRIL BUS (INCLUYE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2024)



FEBRERO

REVISIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA REMITIDA POR LOS GL

LEVANTACIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (DATOS ESTÁTICOS) DE CAMPO POR PARTE DE LOS GL DE TODAS LAS VIAS POTENCIALES



MARZO

PRIMER VIAJE DE COMISIÓN
INSPECCIÓN DE LAS VÍAS POTENCIALES PARA EL PILOTO (S) CARRIL BUS

ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE LA (S) VIA (S) O TRAMO (S) DONDE SE IMPLEMENTARÁ EL PILOTO CARRIL BUS

DEFINICIÓN DE ESTUDIOS DE CAMPO Y CAPACITACIÓN A LOS GL PARA DATOS DE LINEA BASE

ABRIL

SEGUNDO VIAJE DE COMISIÓN
CAPACITACION, TRABAJOS DE CAMPO Y SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE CAMPO EJECUTADOS POR EL GL PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LÍNEA BASE

DIGITALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LÍNEA BASE

DISEÑO OPERATIVO Y DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO PARA EL PILOTO CARRIL BUS (PLANOS)

GESTIONES PRELIMINARES PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ESPECÍFICO

MAYO

ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO PARA EL PILOTO CARRIL BUS POR PARTE DEL GL

FIRMA DE CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE PROMOVILIDAD Y LOS GL

EMISIÓN DE LA AUTORIZACION POR PARTE DEL GL PARA LA IMPLEMENTACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PILOTO (S) CARRIL BUS

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PILOTOS CARRIL BUS (OPERADORES DE TRANSPORTE, SOCIEDAD CIVIL, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PNP, ENTRE OTROS)

PROCESO DE COMUNICACIÓN DE LOS PILOTOS CARRIL BUS (BANNERS, CARTELES, COMUNICACIÓN EN MEDIOS LOCALES Y REDES SOCIALES)

JUNIO

CAPACITACIÓN A IMT Y PNP SOBRE LA OPERACIÓN DEL PILOTO CARRIL BUS

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SOBRE EL CARRIL BUS

JULIO

PUESTA EN MARCHA DEL PILOTO (S) CARRIL BUS

TERCER VIAJE DE COMISIÓN
SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CAMPO EJECUTADOS POR EL GL EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS CON LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL PILOTO (S) CARRIL BUS



AGOSTO

DIGITALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PILOTOS.

ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE MONITOREO DE LA PUESTA EN OPERACION DEL PILOTO CARRIL BUS POR PARTE DEL GL


MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

DIRECTORA DEL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE
NANCY NERIDA AUCAHUASI DONGO

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD
ABEL GALLEGOS CHOQUE

EQUIPO TÉCNICO

ING. CÉSAR WILFREDO BEDÓN HERRERA
ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

ING. CHRISTIAN DANIEL BARRAZUETA MANCILLA
ANALISTA EN GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

BACH. ING. BRESCHEL Y MALYN ORTIZ PARRA
ASISTENTE TÉCNICO

EQUIPO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO

ING. CÉSAR WILFREDO BEDÓN HERRERA
ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

ING. CHRISTIAN DANIEL BARRAZUETA MANCILLA
ANALISTA EN GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1.2. Reuniones de avance con la MPT


29/01/25

PRESENTACIÓN DE A.T. CARRIL BUS




14/02/25

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA

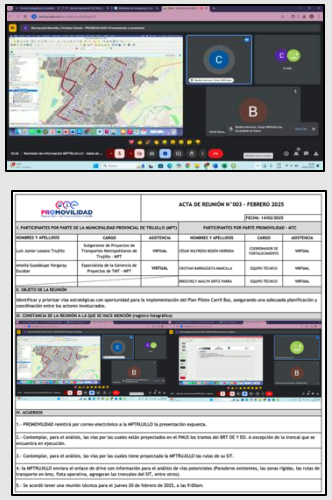

03/02/25

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE TABLA DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE VÍAS

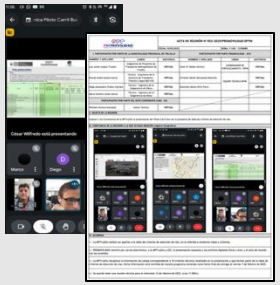


20/02/25

ACTUALIZACIÓN DE TABLA DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE VÍAS POTENCIALES



10/03/25

REVISIÓN DE PESOS ASIGNADOS A LA TABLA DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE VÍAS

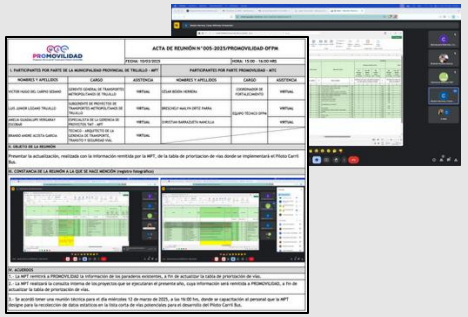


12/03/25

CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO PARA LOS TRABAJOS DE RECOP. DE DATOS ESTÁTICOS



14/03/25

DEFINICION DE LAS 5 VIAS POTENCIALES PARA EL PILOTO CARRIL BUS

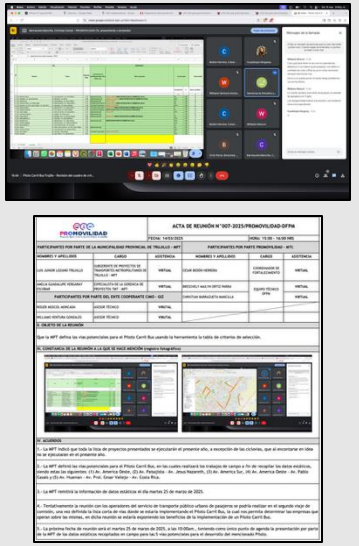

VIAJE DE COMISIÓN


03/04/25 - 04/04/25

28/03/25

ENTREGA DE DATOS ESTÁTICOS A PROMOVILIDAD

25/03/25

PRESENTACIÓN DE DATOS ESTÁTICOS POR PARTE DE LA MPT

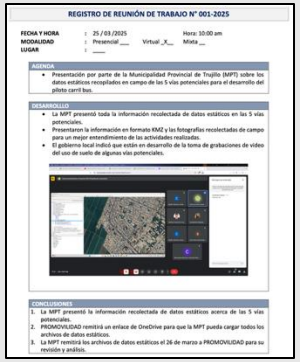

1.3. Selección de vías potenciales

Se elaboró un **análisis espacial de la vialidad** en la ciudad de Trujillo, donde obtuvo un **total de 176 vías.**

De las 176 vías en mención tenemos que 154 cuentan con 2 carriles, 15 con 3 carriles y 7 con 4 carriles.

En este análisis, se establecieron criterios tanto operativos como de infraestructura, considerando aspectos como la sección vial, tipo de vía, longitud de la vía, número de carriles, entre otros, a fin de evaluar las vías potenciales para la implementación de un Piloto Carril Bus. **Donde finalmente no se consideraron las vías que forman parte del corredor troncal norte – sur del BRT que se encuentra en ejecución, las que tienen poca longitud y que cuentan con un carril por sentido de circulación, que en su mayoría eran vías locales.**



1.3. Selección de vías potenciales

El mapa muestra las **69 vías principales donde operan las rutas de transporte público de pasajeros,** identificando la cantidad de carriles por sentido de circulación en cada vía.



1.3. Selección de vías potenciales

El mapa muestra las **51 vías donde operan los autos colectivos y que su recorrido autorizado se superpone a la operación del servicio de las rutas de transporte público de pasajeros.**




1.3. Selección de vías potenciales

Para la elaboración del presente mapa se han considerado las vías que cuentan con 2 o más carriles por sentido de circulación, no se consideran las vías que forman parte del corredor troncal norte – sur del BRT que se encuentra en ejecución, se consideran las vías donde se encuentra autorizado el servicio de transporte público de pasajeros, no se consideran las vías donde se superpone la operación del servicio de autos colectivos autorizados con las rutas de transporte público de pasajeros.

Finalmente, luego de realizado el análisis, descrito en el párrafo precedente, son 18 las vías donde solo opera el servicio de transporte público de pasajeros, cuya lista y mapa se muestran a continuación.

N°	vías	
	Nombre	Tramo
1	Av. America Oeste	Av. Jesus Nazareth - Av. Juan Pablo II
2	Av. Paisajista - Av. Jesus Nazareth	Av. Mansiche - Av. Roma
3	Av. America Sur	Ca. Carlos Wiesse - Av. Cesar Vallejo
4	Av. America Oeste - Av. Pablo Casals	Av. Jesus Nazareth - Av. Tupac Amaru
5	Av. Huaman - Av. Prol. Cesar Vallejo - Av. Costa Rica	Ca. Obregoso - Ca. Nueva Zelanda
6	Av. America Norte	Av. Manuel Vera - Av. Tupac Amaru
7	Av. Federico Villareal	Av. Prol. Santa - Av. Cesar Vallejo
8	Av. Cesar Vallejo	Av. America del Sur - Av. Pumacahua
9	Av. Jose Maria Eguren	Av. España - Av. America Sur
10	Av. Tupac Amaru	Av. Salvador Lara - Av. America Norte
11	Av. Metropolitana II	Av. Mansiche - Av. Metropolitana I
12	Av. Salvador Lara	Av. Manuel Vera - Av. Tupac Amaru
13	Av. Honorio Delgado	Av. Ricardo Palma - Av. Federico Villareal
14	Av. Metropolitana I	Av. Jose Condorcanqui - Av. El Cortijo
15	Av. Fatima	Av. Victor Larco Herrera - Av. Prol. Cesar Vallejo
16	Av. Antenor Orrego	Av. Jesus Nazareth - Av. America Oeste
17	Av. Juan Pablo II	Av. Huaman - Ovalo Papal
18	Av. Huamán	Av. Juan Pablo II - Av. Manuel Soane

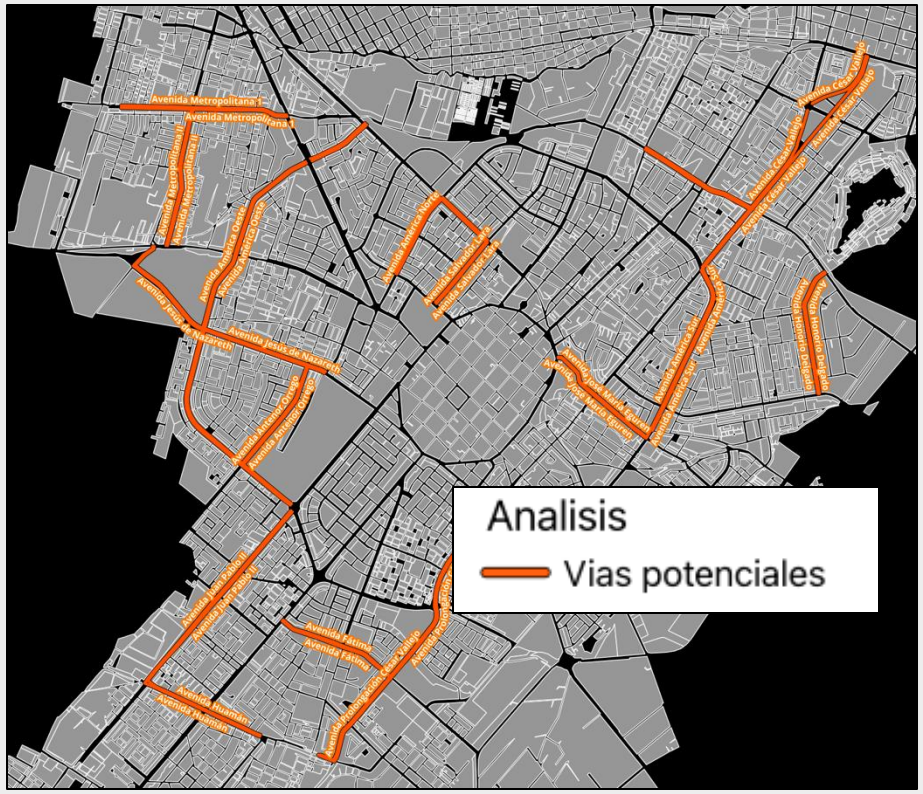

1.4. Tabla de criterios de selección de vías

Para determinar las vías que cuentan con potencial para la implementación del Piloto Carril Bus, se elaboró la "Tabla de criterios de selección de vías", donde se establecieron criterios con sus respetivas ponderaciones, a fin de definir la lista corta de vías que posteriormente pasarán a un análisis detallado del estado de la infraestructura vial, del funcionamiento y/u operación del tránsito sobre las vías, de los dispositivos de control de tránsito, del transporte público de pasajeros, entre otros (datos estáticos), cuyos criterios en mención se describen a continuación:

- Uso de suelo.
- Rutas de transporte.
- Rutas SITT.
- Tipologia vehicular.
- Flota vehicular.
- Paraderos de autorizados.
- Sentidos de circulación.
- Número de carriles por sentido de circulación.
- Jerarquización vial.
- Zona rígida
- Estacionamiento o parqueo y comercio informal en la vía.
- Condiciones de tráfico (google maps).
- Siniestos viales.

1.4. Tabla de criterios de selección de vías (ponderación)

Criterio	Concepto del criterio	Puntaje
Uso de suelo	Identificar el uso de suelo (Zona residendial, comercial, Educacional, entre otros) alrededor de las vias potenciales.	El puntaje mayor es 3 puntos, se considera el puntaje conforme a la mayor cantidad de uso de suelo que presente la via.
Rutas de transporte público	Identificar la cantidad de rutas que transitan por la zona para estimar el impacto de los beneficios del piloto.	El puntaje mayor es 3 puntos, se considera el puntaje conforme a la mayor cantidad de rutas que transitan por la via.
Rutas SITT	Se identificó las vías que se superponen con las rutas propuestas del proyecto del SITT del gobierno local.	El puntaje mayor es 3 puntos, se considera el puntaje conforme a la mayor cantidad de rutas por vía.
Tipología vehicular	Se revisa la tipologia vehicular (M2 y M3) de la flota del transporte público que transita por la via potencial.	El puntaje mayor es 3 puntos, se considera el puntaje en base a la tipologia de mayor capacidad de pasajeros, en caso la tipologia sea mixta (M2 y M3) se considera el que tiene mayor capacidad.
Flota vehicular	Se identifica la cantidad de flota operativa del transporte público que transita por las vias potenciales.	El puntaje mayor es 3 puntos, se considera el puntaje mayor al que presenta mayor cantidad de flota transitando por la via, en caso la flota sea mixta (M2 y M3) se considera el que presente mayor flota.
Paraderos autorizados	Se identifica la cantidad de paraderos existentes en las vias potenciales.	El puntaje mayor es 3 puntos, se considera el puntaje conforme a la mayor cantidad de paraderos que presente la via.
Sentido de circulación	Se identifica el sentido de circulación de las vías potenciales.	El puntaje mayor es 3 puntos, se considera el puntaje conforme a la via que presente doble sentido de circulacion.

1.4. Tabla de criterios de selección de vías (ponderación)

Criterio	Concepto del criterio	Puntaje
Número de carriles por sentido	Se identifica la cantidad de carriles por sentido de circulación que presentan las vias potenciales.	El puntaje mayor es 3 puntos, se considera el puntaje conforme a la via que presente la mayor cantidad de carriles, siendo el minimo 2 carriles por sentidos.
Jerarquización vial	Se identifica la jerarquización vial de las vias potenciales.	El puntaje mayor es 3 puntos, se considera el puntaje conforme la jerarquia (Exprea, Arterial y colectora) que presente la via.
Zona rígida	Se identifica las vias potenciales que tengan normada sus zonas rígidas.	El puntaje mayor es 3 puntos, se considera el puntaje conforme así es o no zona rígida la vía.
Estacionamiento, zona de parqueo o existencia de comercio informal	Se identifica si la via presenta alguna de estas afectaciones, ya sea de manera parcial o en toda la extensión de la vía potencial.	El puntaje mayor es 3 puntos, se considera el puntaje conforme a la vía que presenta menor afectación.
Condiciones del tráfico (google maps)	Se identifica mediante google maps los tramos de las vías potenciales que presentan congestión y/o demoras.	El puntaje mayor es 3 puntos, se considera el puntaje conforme a las condiciones del tráfico, si es baja, regular o alta en la vía potencial.
Siniestros viales	Se identificó mediante el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del MTC la ubicación de los siniestros de tránsito.	El puntaje mayor es 3 puntos, se considera el puntaje conforme a la cantidad de siniestros que han sucedió en la vía.

Total 13 criterios de selección	**Criterios basados en la infraestructura y operación vial (tránsito y transporte)**	**Total 39 puntos**

1.4. Tabla de criterios de selección de vías (vías potenciales)

NOTA:

Son **176 vias,** con 2 o más carriles por sentido de circulación, que forman parte de la red vial de la ciudad de Trujillo (154 tienen 2 carriles, 15 tienen 3 carriles y 7 tienen 4 carriles) y que no se superponen el corredor troncal norte - sur del BRT que se encuentra en ejecución.
De las cuales en **69 vías** opera el servicio de transporte público de pasajeros (rutas).
Y en **51 vías** los colectivos se superponen a la operación el servicio de transporte público de pasajeros (rutas).
Quedando solo **18 vías** por donde solo opera el servicio de transporte público de pasajeros (rutas) sin superposición con los colectivos.

Fuente: Archivos Shape file de la Consultoria Trufi Association - GIZ (red vial y rutas de transporte público de pasajeros)

N°	vías			Uso de suelo		Transporte														
	Nombre	Tramo	Distancia (km)			Rutas (unds)		Rutas SITT (unds)		Tipología vehicular (unds)				Flota vehicular (unds)					Paraderos autorizados	
										M2 Microbus "combis" 10 a 16 psjs	M2 - M3 Minibus "micros" 17 a 33 psjs	M3 Omnibus urbano "bus" < 33 psjs		M2 Microbus "combis" 10 a 16 psjs	M2 - M3 Minibus "micros" 17 a 33 psjs	M3 Omnibus urbano "bus" < 33 psjs				
				Considerado	P	Mayor Cantidad	P	Mayor Cantidad	P	Prioridad el de mayor capacidad de pasajeros, si es flota mixta se considera el mayor			P	Prioridad el de mayor flota, si es flota mixta se considera el mayor				P	Mayor Cantidad	p
				3		3		3		1	2	3		1	2	3	SUMA		3	
1	Av. America Oeste	Av. Jesus Nazareth - Av. Juan Pablo II	1.75	C,R	2.00	8	2.00	La Esperanza, Victor larco, Trujillo, Huanchaco	3.00	X		X	3.00	111		142	253	1.00	4	3.00
2	Av. Paisajista - Av. Jesus Nazareth	Av. Mansiche - Av. Roma	2.00	C,E,R	3.00	6	1.00	Victor Larco, Laredo, Huanchaco	3.00	X		X	3.00	163		44	207	1.00		0.00
3	Av. America Sur	Ca. Carlos Wiesse - Av. Cesar Vallejo	2.76	C,R	2.00	19	3.00	La Esperanza, Trujillo	2.00	X		X	3.00	313		477	790	3.00	1	1.00
4	Av. America Oeste - Av. Pablo Casals	Av. Jesus Nazareth - Av. Tupac Amaru	2.13	C,R	2.00	9	2.00	La Esperanza, Trujillo, Laredo, Huanchaco	3.00	X		X	3.00	91		220	311	2.00		0.00
5	Av. Huaman - Av. Prol. Cesar Vallejo - Av. Costa Rica	Ca. Obregoso - Ca. Nueva Zelanda	2.44	C,E,R	3.00	11	2.00	Victor Larco, Laredo, Huanchaco, El Porvenir	3.00	X		X	3.00	261		186	447	2.00		0.00
6	Av. America Norte	Av. Manuel Vera - Av. Tupac Amaru	1.38	R	1.00	6	1.00	Victor Larco, Huanchaco	2.00	X		X	3.00	170		60	230	1.00	3	3.00
7	Av. Federico Villareal	Av. Prol. Santa - Av. Cesar Vallejo	1.86	E,C	2.00	17	3.00	Victor Larco, Laredo, Huanchaco	3.00	X		X	3.00	377		128	505	2.00		0.00
8	Av. Cesar Vallejo	Av. America del Sur - Av. Pumacahua	4.22	C,E,R	3.00	11	2.00	Trujillo, El Porvenir	2.00	X		X	3.00	218		180	398	2.00		0.00
9	Av. Jose Maria Eguren	Av. España - Av. America Sur	1.10	C	1.00	14	3.00	La Esperanza, El Porvenir	2.00	X		X	3.00	136		402	538	3.00		0.00
10	Av. Tupac Amaru	Av. Salvador Lara - Av. America Norte	0.96	C,R	2.00	9	2.00		0.00	X		X	3.00	34		324	358	2.00	1	1.00
11	Av. Metropolitana II	Av. Mansiche - Av. Metropolitana I	1.09	C,E,R	3.00	2	1.00	La Esperanza, Huanchaco	2.00			X	3.00			118	118	1.00		0.00
12	Av. Salvador Lara	Av. Manuel Vera - Av. Tupac Amaru	1.25	C,E,R	3.00	17	3.00		0.00	X		X	3.00	234		425	659	3.00		0.00
13	Av. Honorio Delgado	Av. Ricardo Palma - Av. Federico Villareal	2.02	C,E,R	3.00	9	2.00	Huanchaco	1.00	X		X	3.00	343		40	383	2.00		0.00
14	Av. Metropolitana I	Av. Jose Condorcanqui - Av. El Cortijo	1.31	C,R	2.00	3	1.00	La Esperanza, Trujillo, Laredo, Huanchaco	3.00			X	3.00			147	147	1.00		0.00
15	Av. Fatima	Av. Victor Larco Herrera - Av. Prol. Cesar Vallejo	0.96	C,R	2.00	1	1.00	Laredo	1.00			X	3.00			48	48	1.00		0.00
16	Av. Antenor Orrego	Av. Jesus Nazareth - Av. America Oeste	1.85	C,E,R	3.00	4	1.00		0.00	X		X	3.00	111		22	133	1.00		0.00
17	Av. Juan Pablo II	Av. Huaman - Ovalo Papal	1.76	C,R	2.00	1	1.00	Victor Larco	1.00			X	3.00			38	38	1.00		0.00
18	Av. Huamán	Av. Juan Pablo II - Av. Manuel Soane	0.99	C,E,R	3.00	2	1.00	Laredo	1.00			X	3.00			66	66	1.00		0.00

1.4. Tabla de criterios de selección de vías (vías potenciales)

NOTA:

Son **176 vias,** con 2 o más carriles por sentido de circulación, que forman parte de la red vial de la ciudad de Trujillo (154 tienen 2 carriles, 15 tienen 3 carriles y 7 tienen 4 carriles) y que no se superponen el corredor troncal norte - sur del BRT que se encuentra en ejecución.
De las cuales en **69 vías** opera el servicio de transporte público de pasajeros (rutas).
Y en **51 vías** los colectivos se superponen a la operación el servicio de transporte público de pasajeros (rutas).
Quedando solo **18 vías** por donde solo opera el servicio de transporte público de pasajeros (rutas) sin superposición con los colectivos.


Fuente: Archivos Shape file de la Consultoria Trufi Association - GIZ (red vial y rutas de transporte público de pasajeros)

N°	vías			Tránsito										Seguridad vial		Puntaje Total
	Nombre	Tramo	Distancia (km)	Sentido de circulación		# carriles x sentido circulación		Jerarquización Vial		Zona rígida		Estacionamiento / parqueo / comercio informal en via		Condiciones del tráfico (google maps)		Siniestros (lesiones graves y fatales)		
					p	Mayor Cantidad	P	Mayor Cantidad	P	Mayor Cantidad	P	Mayor Cantidad	P	Mayor Congestión	P	Mayor Cantidad	P	
				3		3		3		3		3		3		3		
1	Av. America Oeste	Av. Jesus Nazareth - Av. Juan Pablo II	1.75	doble	3.00	3	2.00	Arterial	2.00	SI	3.00	**Estacionamiento parcial en un tramo**	1.50	Alta (Av. América Oeste - Av. Jesús Nazareth) y Ovalo Papal	3.00		0.00	**28.50**
2	Av. Paisajista - Av. Jesus Nazareth	Av. Mansiche - Av. Roma	2.00	doble	3.00	2	1.00	Arterial, Colectora	2.00	SI	3.00	**Estacionamiento parcial en un tramo**	1.50	Alta (semáforo Av. América Oeste y Centro idiomas UNT)	3.00	3	3.00	**27.50**
3	Av. America Sur	Ca. Carlos Wiesse - Av. Cesar Vallejo	2.76	doble	3.00	2	1.00	Arterial	2.00	SI	3.00	**Estacionamiento parcial en un tramo**	1.50	Regular	2.00		0.00	**26.50**
4	Av. America Oeste - Av. Pablo Casals	Av. Jesus Nazareth - Av. Tupac Amaru	2.13	doble	3.00	2	1.00	Arterial	2.00	SI	3.00	**Estacionamiento parcial en un tramo**	1.50	Media y Alta (Mall Plaza Trujillo)	3.00		0.00	**25.50**
5	Av. Huaman - Av. Prol. Cesar Vallejo - Av. Costa Rica	Ca. Obregoso - Ca. Nueva Zelanda	2.44	doble	3.00	2	1.00	Arterial	2.00	NO	1.50	**Estacionamiento y comercio informal (Altura Colegio Bruning) parcial**	1.50	Alta (Av. Golf - Av. America Sur)	3.00		0.00	**25.00**
6	Av. America Norte	Av. Manuel Vera - Av. Tupac Amaru	1.38	doble	3.00	2	1.00	Colectora	1.00	SI	3.00	**No presenta estacionamiento o comercio informal**	3.00	Regular y Alta (semáforo Av. América Norte - Av. Tupac Amaru)	3.00		0.00	**25.00**
7	Av. Federico Villareal	Av. Prol. Santa - Av. Cesar Vallejo	1.86	doble	3.00	2	1.00	Colectora	1.00	SI	3.00	**Estacionamiento parcial en un tramo**	1.50	Regular	2.00		0.00	**24.50**
8	Av. Cesar Vallejo	Av. America del Sur - Av. Pumacahua	4.22	doble	3.00	2	1.00	Arterial	2.00	SI	3.00	**Estacionamiento y comercio informal (Altura de Mercados y Pumacahua) parcial**	1.50	Regular (Av. America - Av. Federico Villareal)	2.00		0.00	**24.50**
9	Av. Jose Maria Eguren	Av. España - Av. America Sur	1.10	doble	3.00	2	1.00	Colectora	1.00	SI	3.00	**Estacionamiento y comercio informal en toda la extensión**	0.00	Alta	3.00	1	1.00	**24.00**
10	Av. Tupac Amaru	Av. Salvador Lara - Av. America Norte	0.96	doble	3.00	2	1.00	Colectora	1.00	SI	3.00	**Estacionamiento parcial en un tramo**	1.50	Alta (semáforo Av. América Norte - Av. Tupac Amaru)	3.00		0.00	**22.50**
11	Av. Metropolitana II	Av. Mansiche - Av. Metropolitana I	1.09	doble	3.00	2	1.00	Arterial	2.00	NO	1.50	**Estacionamiento parcial en un tramo**	1.50	Alta (semáforo Mall Plaza)	3.00		0.00	**22.00**
12	Av. Salvador Lara	Av. Manuel Vera - Av. Tupac Amaru	1.25	doble	3.00	2	1.00		0.00	SI	3.00	**Estacionamiento parcial en un tramo**	1.50	Baja	1.00		0.00	**21.50**
13	Av. Honorio Delgado	Av. Ricardo Palma - Av. Federico Villareal	2.02	doble	3.00	2	1.00	Colectora	1.00	SI	3.00	**Estacionamiento parcial en un tramo**	1.50	Baja	1.00		0.00	**21.50**
14	Av. Metropolitana I	Av. Jose Condorcanqui - Av. El Cortijo	1.31	doble	3.00	2	1.00		0.00	SI	3.00	**Estacionamiento parcial en un tramo**	1.50	Baja	1.00	1	1.00	**20.50**
15	Av. Fatima	Av. Victor Larco Herrera - Av. Prol. Cesar Vallejo	0.96	doble	3.00	2	1.00	Colectora	1.00	SI	3.00	**Estacionamiento parcial en un tramo**	1.50	Regular	2.00	1	1.00	**20.50**
16	Av. Antenor Orrego	Av. Jesus Nazareth - Av. America Oeste	1.85	doble	3.00	2	1.00	Colectora	1.00	SI	3.00	**Estacionamiento parcial en un tramo**	1.50	Baja	1.00		0.00	**18.50**
17	Av. Juan Pablo II	Av. Huaman - Ovalo Papal	1.76	doble	3.00	2	1.00	Colectora	1.00	SI	3.00	**Estacionamiento parcial en un tramo**	1.50	Baja	1.00		0.00	**18.50**
18	Av. Huamán	Av. Juan Pablo II - Av. Manuel Soane	0.99	doble	3.00	2	1.00	Colectora	1.00	NO	1.50	**Estacionamiento parcial en un tramo**	1.50	Baja	1.00		0.00	**18.00**

1.4. Tabla de criterios de selección de vías (lista corta de vías potenciales)

Luego de hacer la ponderación a cada criterio de la lista larga de 18 vías, validada y/o aprobada por la MPT, la MPT decidió que se considere dentro de la **evaluación a las primeras 5 vías potenciales,** las mismas que pasarán un análisis detallado de su infraestructura y operación de tránsito y transporte.

N°	vías			Puntaje Total
	Nombre	Tramo	Distancia (km)	
1	Av. America Oeste (3 carriles)	Av. Jesus Nazareth - Av. Juan Pablo II	1.75	**28.50**
2	Av. Paisajista - Av. Jesus Nazareth	Av. Mansiche - Av. Roma	2.00	**27.50**
3	Av. America Sur	Ca. Carlos Wiesse - Av. Cesar Vallejo	2.76	**26.50**
4	Av. America Oeste - Av. Pablo Casals (2 carriles)	Av. Jesus Nazareth - Av. Tupac Amaru	2.13	**25.50**
5	Av. Huaman - Av. Prol. Cesar Vallejo - Av. Costa Rica	Ca. Obregoso - Ca. Nueva Zelanda	2.44	**25.00**

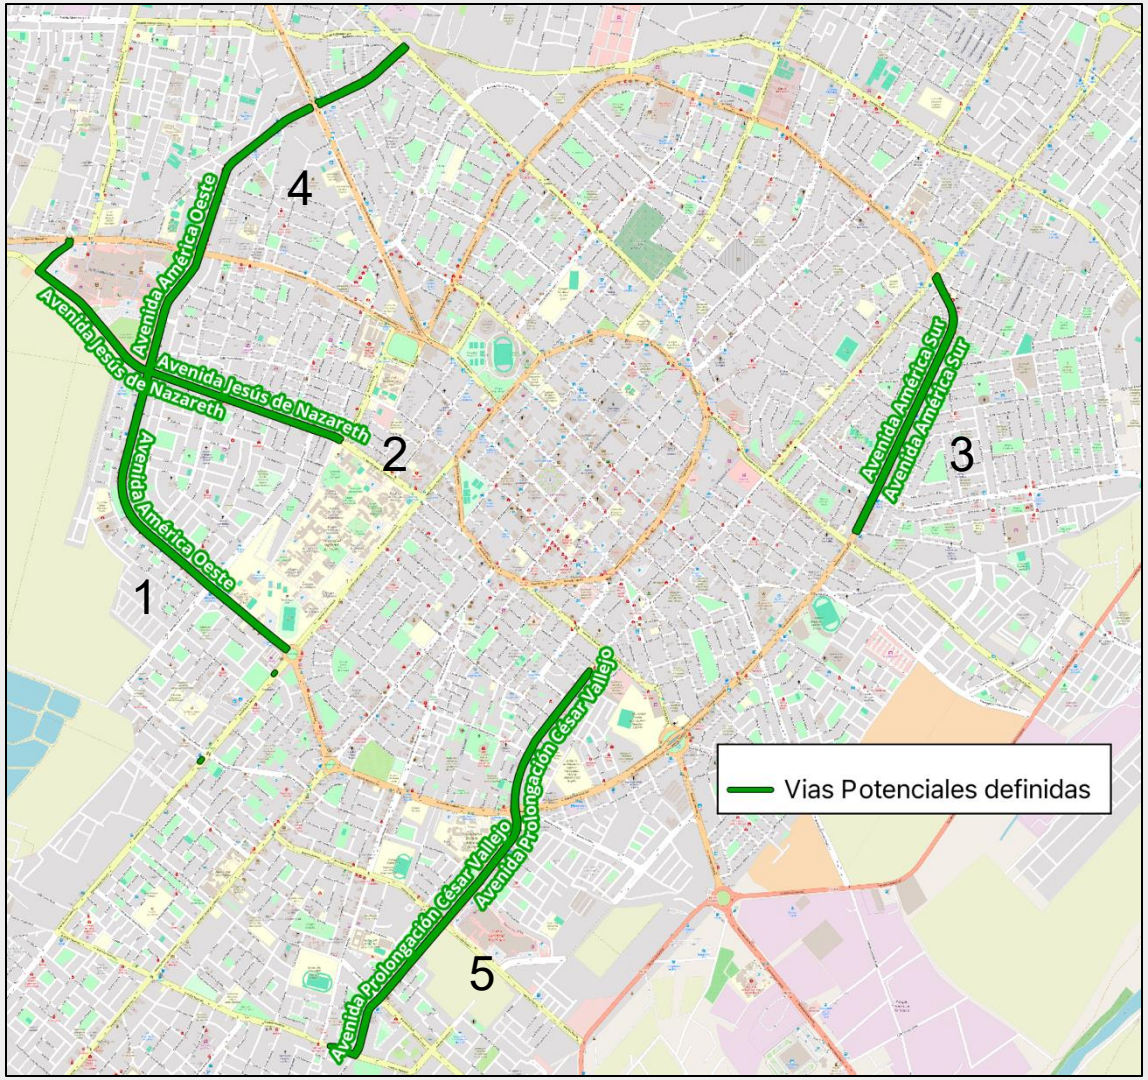



2

PASO SIGUIENTE

Paso siguiente

- Realizar la inspección de campo en conjunto con la MPT a las 5 vías potenciales para la implementación del Piloto Carril Bus, donde se realizarán los siguientes trabajos de recolección de información por cada vía:
  - ✓ Uso de suelo.
  - ✓ Señalización horizontal y vertical.
  - ✓ Número de carriles.
  - ✓ Sentidos de circulación.
  - ✓ Zonas rígidas.
  - ✓ Estado de conservación de las vías.
  - ✓ Validación de operación de rutas de transporte público de pasajeros sobre las vías.
  - ✓ Ubicación de paraderos de transporte público de pasajeros.
  - ✓ Identificación de estacionamientos adyacentes a la calzada.
  - ✓ Identificación de estacionamientos de ingreso y salidas a predios.
  - ✓ Identificación visual de puntos críticos de tránsito de las unidades de transporte público de pasajeros.
  - ✓ Vuelos con dron para obtener fotos y videos de los 05 ejes viales en mención.
  - ✓ Se evaluará en las horas de mayor demanda, la hora punta mañana, tarde y noche, las condiciones de operatividad de las vías, a fin de poder definir los puntos de toma de información para la línea base (demanda de vehículos por tipología, demanda de pasajeros, uso de paraderos y velocidades) y los horarios de recolección de las mismas, lo cual nos permitirá planificar los trabajos de la siguiente comisión técnica.
- El cronograma de trabajo para la visita técnica es el siguiente:

  Día 1, se realizará una reunión de trabajo con los funcionarios de la MPT, posteriormente se inspeccionarán y recopilará información de campo en las siguientes vías: Av. América Oeste (1.75km) y Av. Paisajista – Av. Jesús Nazareth (2.00km).
  Día 2, se inspeccionarán y recopilará información de campo en las siguientes vías: Av. América Sur (2.76km), Av. América Oeste – Av. Pablo Casals (2.13km) y Av. Huamán – Av. César Vallejo – Av. Costa Rica (2.44km).



3

CONCLUSIONES

Conclusiones

- Luego del análisis realizado a las 176 vías iniciales, se seleccionaron 18, las cuales fueron ingresadas a la “Tabla de criterios de selección de vías” a fin de realizar la ponderación correspondiente, donde la MPT decidió que se considere dentro de la evaluación a las primeras 5 vías potenciales, las mismas que pasarán un análisis detallado de su infraestructura y operación de tránsito y transporte.
- Realizar una visita técnica de 2 días a la ciudad de Trujillo, a fin de inspeccionar en campo, mediante un trabajo en conjunto con la MPT, las 5 vías potenciales para la implementación del Piloto Carril Bus.

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PROMOVILIDAD
Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

Ponle PUNCHE y ganamos todos PERÚ

GRACIAS
